



## SMLOUVA O DÍLO č. 6925-9553,9554-2018

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“), v platném znění, mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Městský úřad Velká Bíteš	
Došlo:	20. 03. 2018
Sp. MÚVB	20 88/18
Zpracoval:	Spis-skart. znak:
M/POH	
Počet listů/příloh:	4/1

**Objednatel,**

**Město Velká Bíteš**  
**Masarykovo náměstí 87**  
**Velká Bíteš 595 01**

zastoupeným: Ing. Milanem Vlčkem – starosta města  
zmocněnec objednatele oprávněný ke všem jednáním týkajícím se  
technického řešení: Ing. Ladislav Rada, vedoucí odboru majetkového  
Bankovní spojení: 172 675 1/0100  
Společnost zapsána: KB Žďár nad Sázavou, pobočka Žďár nad Sázavou  
Telefon: 566 789 130 e-mail: ladislav.rada@vbites.cz

IČ: 00295647  
DIČ: CZ00295647

**Akce: „Modernizace výtahů bytových domů  
na ulici U Stadionu 548 vchod C, 475 vchod C, Velká Bíteš“**

*jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel,**

**VÝTAHY, s.r.o.**  
**Vrchovecká 216**  
**Velké Meziříčí 594 29**

zastoupeným: Lubošem Minaříkem - jednatel společnosti  
zmocněnec ve věci projekce: Oldřich Kuřec  
zmocněnec ve věci výroby a dodávky: Martin Krejčí  
zmocněnec ve věci montáže: Eduard Kadela  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú. 175722849/0600  
Společnost zapsána v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 5254 ze dne 27.3.1992

IČ: 46342354  
DIČ: CZ46342354

*jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)*

takto:

## I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele rekonstrukci 2 ks výtahů v **BD U Stadionu 548 C a 475 C, Velká Bíteš - akce: „Modernizace bytových domů 548C a 475C v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši“**

Účelem díla je výměna 2 ks stávajících výtahů za nové bubnové výtahy BOV 320/0,63 MAXIM vč. nového opláštění výtahové šachty. Ze stávajících výtahů budou ponechány konzoly a vodítka kabiny.

Předmět plnění obsahuje projekci, výrobu, dodávku, demontáž stávajících a montáž **2 ks nových výtahů BOV 320/0,63 MAXIM 6/6 neprůchozí + opláštění výtahové šachty** dle nabídky č. 129/2018 ze dne 19.2.2018, vlastního zaměření zhotovitele, níže uvedeného popisu a sepsané specifikace. Součástí předmětu plnění je zhotovení strojní dokumentace rekonstrukce výtahů.

**Výtahy budou zhotoveny dle normy EN 81-20 a 81-50, platné od 1.9.2017.**

## II. Popis díla

### Technická specifikace zakázky

třída	I. výtah určený pro dopravu osob
typ	BOV 320/0,63
nosnost	320 kg – 4 osoby
rychlost	0,63 m.s <sup>-1</sup>
dopravní zdvih	14m
stanice/nástupiště	6/6
pohon	výtahový stroj S 4 BOV 320/0,63 elektromotor o výkonu 5,5kW a lanový buben ø 450 mm, elektromotor je řízen frekvenčně s plynulým rozjezdem a dojezdem výtahu do stanice
nosné prostředky	2 x lano ø 10 mm EN ČSN 12385-5
klec výtahu	konstrukční rozměr (š. x hl.) = 850x 1270mm, světlý rozměr (š. x hl. x v.) = <b>810 x 1250 x 2000mm, neprůchozí,</b>
klecové dveře	automatické typu BUS v NEREZ provedení světlý rozměr (š. x v.) = 800 x 2 000mm
šachetní dveře	jednokřídlové ruční v barevném provedení RAL 7035, vsazené do ocelových portálů čelní stěny světlý rozměr (š. x v.) = 800 x 2 000mm
konzoly a vodítka	klece stávající
řízení výtahu	tlačítkové jednoduché se sběrem směrem dolů
el. instalace výtahu	vodiči Cu s instalací odpovídající požadavkům PO

### Klec

Výplň – stěny klece včetně stropu jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Stěny jsou obloženy deskami POLYREY I 004, strop klece je lakován práškovou barvou RAL 9010. Osvětlení klece je provedeno LED diodami ve stropu. Podlaha je polepena protiskluzovým ALTREM VMI 2052. Na zadní stěně je umístěno trubkové NEREZ madlo a nad madlem zrcadlo.

### Ohrazení výtahové šachty

Nové ohrazení zadní stěny a bočních stěn šachty - provedeno plným materiálem deskami Rigistabil s oplechovanými rohy a s povrchovou úpravou konečným nátěrem RAL 9010.

### Modernizace výtahu obsahuje

- zaměření stávající výtahové šachty a strojovny výtahu
- vypracování projektové dokumentace modernizace výtahu a její schválení autorizovanou osobou

- demontáž stávajícího výtahu mimo konzol a vodítek kabiny
- odvoz demontovaného materiálu a jeho likvidace v souladu se zákonem
- výroba nového výtahu
- montáž nového výtahu včetně OTK
- montáž nového opláštění
- nátěr stávajícího zábradlí RAL 7035 + nová dřevěná madla
- úřední zkouška výtahu za účasti autorizované osoby
- stavební práce spojené s modernizací výtahu
  1. zvětšení otvoru pro nosná lana
  2. vybourání betonových špalků v prohlubni
  3. vybourání betonového základu stroje
  4. úprava podlah v šachtě a strojovně

#### **Malířské práce:**

Malířský nátěr opláštění šachty a celého prostoru schodiště. Součástí je očištění a ometení od prachu, oškrabání poškozených míst a jejich zapravení, malba 2x malířský nátěr bílý, sokl do stávající výše 1,05m proveden tónovanou malbou s latexem. Po výmalbě bude proveden úklid včetně očištění podlah, oken, výtahové šachty a zábradlí.

#### **Objednatel zajistí na vlastní náklady související práce:**

- poskytnutí uzamykatelné místnosti pro uskladnění náradí a drobného materiálu potřebného pro montáž
- poskytnutí el. proudu pro ruční el. náradí
- zajištění SIM karty pro GSM bránu
- provedení revize hlavního přívodu el. proudu
- zajištění osvětlení nástupišť dle normy 81-20

### **III. Cena**

Cena díla popsaného v čl. II a v přílohách této smlouvy byla dohodnuta mezi smluvními stranami na **1 410 000,- Kč**, slovy *jedemmiliónčtyřístadesettisíc* korun českých bez DPH. DPH bude uhrazena dle předpisu o přenesené daňové povinnosti.

Cena za projekci výtahu bez DPH:	<b>16 000,- Kč</b>
Cena za výrobu a dodávku výtahu bez DPH:	<b>449 000,- Kč</b>
Cena za demontáž a montáž výtahu bez DPH:	<b>78 000,- Kč</b>
Cena za nové opláštění výtahové šachty bez DPH:	<b>85 000,- Kč</b>
Cena za nová dřevěná madla bez DPH:	<b>15 000,- Kč</b>
Cena za stavební úpravy bez DPH:	<b>18 000,- Kč</b>
<b>Celkem za výtah bez DPH:</b>	<b>661 000,- Kč</b>
Cena za malířské práce bez DPH:	<b>44 000,- Kč</b>
<b>Celková cena za modernizaci 1 ks výtahu bez DPH:</b>	<b>705 000,- Kč</b>
<b>Celková cena za modernizaci 2 ks výtahů bez DPH:</b>	<b>1 410 000,- Kč</b>
DPH 15%	<b>211 500,- Kč</b>
<b>Celková cena za modernizaci 2 ks výtahů včetně DPH:</b>	<b>1 621 500,- Kč</b>

Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele související s komplexní realizací výše popsaného díla.

V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s projekcí, výrobou, dopravou, demontáží, montáží a zkouškami výtahu, jakož i stavební a související práce výše jmenované. Cena bude dodržena po celou dobu vlastní realizace. Případné vícepráce budou oceněny samostatně a odsouhlaseny objednatelům i zhotovitelem.

## IV. Platební podmínky

1. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli předmět plnění takto:
  - a) Po provedení dodávky a montáže jednotlivého výtahu, zhotovení opláštění výtahové šachty, malířských pracích v bytovém domě a předání díla objednateli bez závad, vystaví zhotovitel fakturu-daňový doklad za jeden výtah na částku ve výši **705 000,- Kč** bez DPH se splatností **21 dnů** od prokazatelného doručení faktury objednateli.
3. Všechny faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Za provedenou úhradu se považuje připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

## V. Doba plnění

### Předpokládaný termín

#### 1. Realizace výtahu zak.č. 9553 – BD U Stadionu č. 548 vchod C:

Zahájení prací na opláštění: (přerušovaný provoz stávajícího výtahu)	14.05.2018
Zahájení montáže výtahu:	21.05.2018
Ukončení prací + OTK:	19.06.2018
Předání výtahu:	25.týden 2018

#### Realizace výtahu zak.č. 9554 – BD U Stadionu č. 475 vchod C:

Zahájení prací na opláštění: (přerušovaný provoz stávajícího výtahu)	11.06.2018
Zahájení montáže výtahu:	20.06.2018
Ukončení prací + OTK:	20.07.2018
Předání výtahu:	30.týden 2018

*Malířské nátěry a malba budou probíhat současně s modernizací výtahů tak, aby byl dodržen konečný termín spuštění výtahů do provozu dle výše uvedeného harmonogramu prací.*

2. Termíny předmětu plnění platí za předpokladu, že objednatel odsouhlasí a doručí tuto smlouvu zhotoviteli do termínu **20.03.2018** Termínem dodávky se rozumí, dodání technologie výtahu do místa montáže. Termínem předání se rozumí předání díla – výtahu objednateli, včetně zkoušky po montáži a úřední zkoušky za účasti autorizované osoby a podepsaného předávacího protokolu smluvními stranami. Zhotovitel není v prodlení s prováděním nebo předáním díla, pokud objednatel nemá řádně vyrovnány a uhrazeny veškeré závazky vůči zhotoviteli plynoucí z této smlouvy, nebo pokud je objednatel v prodlení s poskytnutím nutné součinnosti, zejména stran stavební připravenosti. O dobu případného prodlení objednatele s úhradou závazků zhotoviteli dle této smlouvy nebo o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti je zhotovitel oprávněn prodloužit termín předání díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že termín **10.08.2018** je nejpozdějším termínem pro předání a převzetí celého díla, s výjimkou postupu dle čl. V, ods. 2, poslední věta. V této lhůtě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a po provedení výše uvedených zkoušek a revizí odevzdat objednateli. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. *Případné závady budou odstraněny do 14 dnů od převzetí díla.*
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

## VI.

### Odovědnost za vady, záruka za jakost, vlastnictví

1. Vady díla - smluvní strany se dohodly na tom, že pro vztahy vyplývající z této smlouvy platí ustanovení § 2615 – 2619 OZ. Vadu je třeba oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, jakmile ji objednatel zjistil, resp. při náležitě pozornosti zjistit měl, nejpozději však do šesti let od předání díla.
2. Záruka za jakost - záruční doba komponent výtahu byla mezi smluvními stranami sjednána takto:

#### 2.1. Záruka za předmět plnění je 72 měsíců

#### 2.2. Záruka se nevztahuje:

- na spotřební materiál
- na opotřebení zboží nad rámec běžného užívání, mechanické poškození zboží, poškození nepřijatelným zásahem včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem nebo živelnou událostí
- na zboží, které bylo instalováno nebo obsluhováno v rozporu s návodem k obsluze
- na poškození, které bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, při styku s vodou, v důsledku přírodních nebo jiných lokálních jevů (bouřky, přepětí v síti apod.)
- na zboží, které bylo používáno pro jiné účely, než je obvykle určeno

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Zhotovitel si vyhrazuje právo, že montážní a servisní práce budou provedeny zhotovitelem nebo jím určenou montážní a servisní firmou.

Reklamací vady komponenty, na kterou se vztahuje záruka za jakost je objednatel povinen předat zhotoviteli písemně s popisem vady. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě zhotoviteli a stanovení dodatečné přiměřené, nejméně pětidenní lhůty k odstranění vady, zajistit odstranění vady a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad.

3. Riziko vzniku škody na prováděném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla.
4. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele úplným uhrazením ceny díla.

## VII.

### Závazky objednatele a zhotovitele

1. Objednatel nebo technický dozor objednatele je oprávněn provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla a plnění smluvních podmínek.
2. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálu a zařízení zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště – montáže.
3. Objednatel zajistí prostory pro uskladnění technologie výtahu a náradí potřebného pro montáž výtahu a prostory pro uložení demontovaného materiálu. V případě, že pozemek je majetkem města, objednatel zajistí zábor pro uložení demontovaného materiálu po dobu nezbytně nutnou při rekonstrukci výtahu.
4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré bezpečnostní a jiné předpisy stejně jako případná rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovovaného díla.
5. Zhotovitel není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
6. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi – místu montáže vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je zhotovitel povinen zajistí, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná

opatření. Dojde-li v souvislosti s prováděnými pracemi zhotovitelem ke škodě na majetku SVJ nebo vlastníků bytových jednotek, odpovídá zhotovitel za opravy nebo náhradu škody.

7. Zhotovitel povede záznam o stavbě – montážní deník, v němž bude zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité (zejména je povinen zapisovat údaje o stavu pracoviště, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla), pro řádné provádění díla. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro postup montáže pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí záznamu o stavbě. Záznam bude uložen u vedoucího montéra a objednatel nebo jím pověřený dozor má právo kdykoli do něj nahlížet a zapisovat. Originál záznamu o stavbě je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
8. Demontáž i montáž výtahu proběhne podle technické specifikace a postupu dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.
9. Zhotovitel zajistí odvoz veškerého materiálu (neupotřebitelného), který vznikne při demontáži původního a montáži nového výtahu, do sídla společnosti VÝTAHY, s.r.o., Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, kde bude roztríděn a zhodnocena možnost opětovného využití. Pokud bude materiál vykazovat vlastnosti odpadu, bude zařazen dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Na základě tohoto postupu při demontáži a montáži výtahu, nevzniknou ostatní ani nebezpečné odpady. Zhotovitel vystaví „Doklad o likvidaci neupotřebitelného materiálu po demontáži a montáži výtahu“, který bude objednateli předložen při předání a převzetí díla. Finanční prostředky získané roztríděním neupotřebitelného materiálu na materiál, který lze případně využít nebo recyklovat, tedy finančně zhodnotit, budou použity na platbu za likvidaci materiálu, který je nutné dle zákona odstranit prostřednictvím oprávněné osoby.  
V případě likvidace materiálu vzniklého při demontáži a montáži výtahu objednatel, je tento povinen provést likvidaci veškerého materiálu (železo, dřevo, stavební suť, ...) dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.  
V případě požadavku objednatele na ponechání některých částí demontovaného výtahu nebo z opláštění šachty, je tento taktéž povinen provést likvidaci veškerého materiálu, který vznikne při demontáži a montáži výtahu.
10. Svařovat v areálu objektu bude možné pouze na základě povolení ke svařování, které před započítím práce vystaví zástupce zhotovitele (vedoucí montér) ve spolupráci s objednatel nebo jím pověřenou osobou. Objednatel zajistí následný dohled po skončení svařování po dobu osmi hodin dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., § 4, odst. 1. Za započítím svařování a jeho bezpečný průběh z hlediska PO zodpovídá zhotovitelem určený pracovník, který nesmí dát pokyn k zahájení práce nebo zahájit práci bez řádně vyplněného „Povolení ke svařování“. Za zajištění požární prevence po dobu svařování zodpovídá zhotovitelem určený pracovník, za následný dohled zodpovídá objednatel. Jestliže objednatel odmítne vyplnit a potvrdit „Povolení ke svařování“ a zajistit následný dohled po svařování, nebude možné pokračovat v práci na díle a tím nebude možné dodržet termín předání díla do užívání.

## VIII.

### Splnění závazku zhotovitele

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno dnem protokolárního předání a převzetí díla – podpisem Zápisu o předání díla, kdy nejpozději je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Součástí splnění smlouvy je předání dokumentace výtahu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany písemný zápis – Zápis o předání díla. Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec objednatele i zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Případné výhrady se uvedou v předávacím protokolu.

## IX.

### Smluvní pokuta

1. V případě prodlení objednatele s placením faktur podle této smlouvy většího než 7 dnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Vedle smluvní pokuty je zhotovitel oprávněn požadovat i náhradu škody v plném rozsahu.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 7 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
3. Jiné náhrady mezi smluvními stranami nejsou sjednány.

## X.

### Změny smlouvy, odstoupení

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálů nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.
2. Odstoupit od smlouvy mohou smluvní strany ze zákonných důvodů, v souladu s § 2001 – 2005 OZ.
3. Objednatel je také oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy:
  - zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po výzvě v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem,
  - zhotovitel se dostane do prodlení s dokončováním jednotlivých etap díla podle čl. V, této smlouvy nebo s předáním díla a toto prodlení je větší než 21 dnů,
  - na zhotovitele byl prohlášen úpadek.
4. Zhotovitel je také oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, jestliže je objednatel v prodlení s placením faktur větším než 21 dnů nebo jestliže objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem.
5. V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.
6. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve **dvou vyhotoveních**, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden exemplář.
2. Přílohami této smlouvy jsou:
  - *Nabídka č.129/2018*
  - *Doklady zhotovitele:*
    - *Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku*
    - *Osvědčení o registraci DIČ*
    - *Oprávnění Technické Inspekce ČR*
3. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.


4. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoliv ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoliv ze smluvních stran bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem v případě vyšší moci. Za vyšší moc se považují zejména živelné události.
5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.
6. Všechny spory, vyplývající z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, se strany zavazují řešit vzájemnou dohodou na úrovni statutárních zástupců obou stran nebo jimi pověřených zástupců. Pro případ, že nedojde ke shodě, si smluvní strany dohodly jako soud první instance místně příslušný soud.
7. Veškeré obchodní, stavební a technické informace, které byly objednateli svěřeny v této smlouvě nebo přílohách, jsou informace důvěrné, objednatel tyto informace nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu spol. Výtahy, s.r.o. Vrchovecká 216 a neužije těchto informací pro jiné účely, než pro plnění předmětu této smlouvy.
8. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady města Velká Bíteš dne 26.02.2018 a byla schválena usnesením č. 29/101/18/RM.


Ve Velkém Meziříčí  
dne 16. 03. 2018

Ve Velké Bíteši  
dne 21. 03. 2018

za zhotovitele:

za objednatele:





**Ing. Milan Vlček**  
starosta města Velká Bíteš



**Vrchovecká 216**  
**594 29 Velké Meziříčí**

**Telefon:** 566 521 531  
**Fax:** 566 521 750  
**E-mail:** [dana.babakova@vytahy.com](mailto:dana.babakova@vytahy.com)

Peněžní ústav  
MONETA Money Bank, a.s. Velké Meziříčí  
č. ú. 175722849/0600  
**IČ:** 46342354  
**DIČ:** CZ46342354

**Město Velká Bíteš**

Ing. Lenka Pohlová

Masarykovo náměstí 87  
**595 01 Velká Bíteš**

tel: 566789132  
e-mail: [lenka.pohlova@vbites.cz](mailto:lenka.pohlova@vbites.cz)

**Váš dopis zn./ze dne**

**Naše značka**  
129/ 2018

**Vyřizuje/Linka**  
Babáková Dana / 156

**Velké Meziříčí**  
19.02.2018

Věc: Nabídka výtahů  
Akce: „Velká Bíteš - U Stadionu 548 vchod C a 475 vchod C“

*Vážení obchodní přátelé,*

*předkládám Vám předběžnou cenovou nabídku na modernizaci výtahu umístěného v ocelové konstrukci opláštěné pletivem se strojovnou nad výtahovou šachtou v bytovém domě č. 548 a 475 na ulici U Stadionu ve Velké Bíteši.*

*Modernizace výtahu je řešena jako výměna za nový bubnový výtah BOV 320/0,63 MAXIM – výtah bez protiváhy.*

*Ze stávajícího výtahu budou ponechány pouze konzoly a vodítka kabiny. Ostatní komponenty výtahu budou dodány nové a budou odpovídat EN 81-20/50.*

*V rámci modernizace bude dodána i nová čelní stěna výtahové šachty - ocelové portály se vsazenými šachetními dveřmi. Šachetní dveře nabízím ruční jednokřídlové v kombinaci s automatickými kabinovými dveřmi typu BUS šíře 800mm, které umožňují přepravu osoby na invalidním vozíku i dětského kočárku.*

*Na výtahu budou odstraněna všechna provozní rizika.*

**BOV MAXIM 320/0,63**

**pro výtahy TOV 250/0,7**

**Výtah MAXIM 320 je osobní výtah o nosnosti 320kg se světlými rozměry klece (šířka x hloubka x výška) = 810x 1250 x 2000mm, jehož podstatou je, že pohon výtahu je bubnový, navíječnický nosné prostředky, na kterých je zavěšena kabina.**

## Vybavení výtahu

### **Klec**

Klec výtahu MAXIM 320 je celokovová, osazena automatickými dveřmi typu BUS světly rozměr (šířka x výška) = 800 x 2 000 mm v NEREZ provedení.

Výplň – stěny klece včetně stropu jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Stěny jsou obloženy deskami POLYREY, strop klece je lakován práškovou barvou. Osvětlení klece je provedeno LED diodami ve stropu. Podlaha je polepena protiskluzovým ALTREM. Na zadní stěně je umístěno trubkové NEREZ madlo a nad madlem zrcadlo.

Nosná konstrukce – rám klece je dodán v pozinkovaném provedení a je opatřen vodícími čelistmi se samomazy, zábradlím a revizní jízdou na stropu. Hlava klece je vybavena samosvornými zachycovači typu SP 50 a tenzometrickým vážením.

### **Pohon**

Výťahový stroj S 4 BOV 320/0,63, elektromotor 5,5kW, dvoučinná brzda 48V, ruční kolo s elektrickým blokováním při nasazení na hřídel elektromotoru, kryt trakčního kotouče, rošt stroje s tlumením a koncovým vypínačem typ VS 32A.

### **Šachetní uzávěry**

Jednokřídlové šachetní dveře ruční světly rozměr (šířka x výška) = 800 x 2 000 mm v lakovaném provedení umístěné v portálu čelní stěny.

### **Rozvaděč**

Rozvaděč bude použit dle přání odběratele z 5 vybraných dodavatelů s jednosměrným sběrem a s frekvenčním měničem.

### **Řízení výtahu** – mikroprocesorové.


Ovládací kombinace v kleci je v provedení ANTIVANDAL, kdy v NEREZ štítu jsou umístěny tlačítka pro jednotlivé stanice, digitální ukazatel polohy stanice, nouzové osvětlení klece a zařízení pro oboustrannou komunikaci – GSM brána pro případ poruchy.

Tlačítka ve stanicích jsou umístěna v zárubni šachetních dveří a jsou vybavena digitálním ukazatelem směru jízdy výtahu, v přízemí pak je toto tlačítko doplněno o ukazatel polohy klece. Tlačítka jsou v provedení ANTIVANDAL v NEREZ štítech.



### Technická data výtahu:

třída	I. výtah určený pro dopravu osob
typ	BOV 320/0,63
nosnost	320 kg – 4 osoby
rychlost	0,63 m.s <sup>-1</sup>
dopravní zdvih	14m
stanice/nástupiště	<b>6/6</b>
pohon	výtahový stroj S 4 BOV 320/0,63 pro zdvih do 25m je použit elektromotor o výkonu 5,5kW a lanový buben ø 450 mm, elektromotor je řízen frekvenčně s plynulým rozjezdem a dojezdem výtahu do stanice
nosné prostředky	2 x lano ø 10 mm EN ČSN 12385-5
klec výtahu	konstrukční rozměr (š. x hl.) = 850x 1270mm, světlý rozměr (š. x hl. x v.) = <b>810 x 1250 x 2000mm,</b> <b>neprůchozí,</b> klecové dveře automatické typu BUS v NEREZ provedení
světlý rozměr (š. x v.)	= 800 x 2 000mm
šachetní dveře	jednokřídlové ruční světlý rozměr (š. x v.) = 800 x 2 000mm vsazené do ocelových portálů čelní stěny
konzoly a vodítka	klece stávající
řízení výtahu	tlačítkové jednoduché se sběrem směrem dolů
el. instalace výtahu	vodiči Cu s instalací odpovídající požadavkům PO

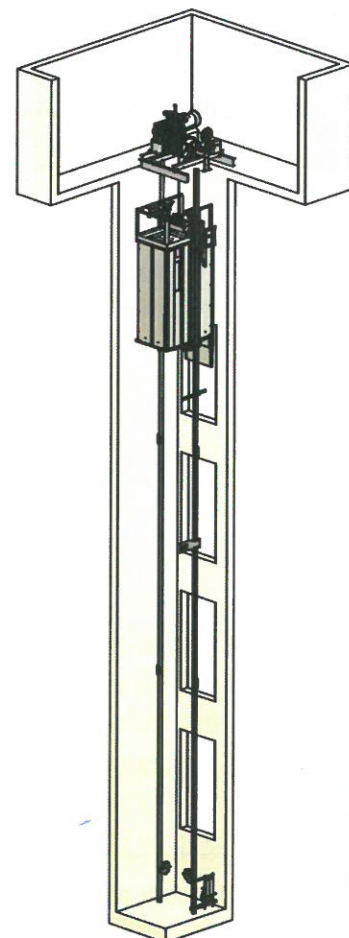

### Ohrazení výtahové šachty:

Bude provedeno nové ohrazení zadní a bočních stěn šachty. Ohrazení bude provedeno plným materiálem deskami Fermacell s oplechovanými rohy a s povrchovou úpravou konečným nátěrem dle vzorníku RAL.

### Modernizace výtahu obsahuje:

- zaměření stávající výtahové šachty a strojovny výtahu
  - vypracování projektové dokumentace modernizace výtahu a její schválení autorizovanou osobou
  - demontáž stávajícího výtahu mimo konzol a vodítek kabiny
  - odvoz demontovaného materiálu a jeho likvidace v souladu se zákonem
  - výroba nového výtahu
  - montáž nového výtahu včetně OTK
  - montáž nového opláštění
  - úřední zkouška výtahu za účasti autorizované osoby
- 
- stavební práce spojené s modernizací výtahu
  - 1. zvětšení otvoru pro nosná lana
  - 2. vybourání betonových špalků v prohlubni
  - 3. vybourání betonového základu stroje
  - 4. úprava podlah v šachtě a strojovně

**Malířské práce:**

Malířský nátěr opláštění šachty a celého prostoru schodiště, barevné řešení bude upřesněno před podpisem smlouvy. Součástí bude očištění a ometení od prachu, oškrabání poškozených míst a jejich zapravení, malba 2x malířský nátěr bílý, sokl bude do stávající výše 1,05m proveden tónovanou malbou s latexem. Odstín bude specifikován před podpisem smlouvy. Po výmalbě bude proveden úklid včetně očištění podlah, oken, výtahové šachty a zábradlí.

Výměry maleb (1 vchod bytového domu):

Malířský nátěr bílý ... 282 m<sup>2</sup>

Malířský nátěr latexový tónovaný ... 142 m<sup>2</sup>

Nátěry kovových konstrukcí (1 vchod bytového domu):

Nátěr zábradlí ... 40,5m, nátěr šachty ... 9,1 m<sup>2</sup>, nátěr dveří ... 1,1 m<sup>2</sup>, nátěr požárního potrubí DN 80 ... 18m, nátěr otopného tělesa 0,6 x 1,1 m, jednostranný nátěr dveří ... 3,2 m<sup>2</sup>

**Nabídková cena – položkový rozpočet**

Cena za projekci výtahu bez DPH:	16 000,- Kč
Cena za výrobu a dodávku výtahu bez DPH:	449 000,- Kč
Cena za demontáž a montáž výtahu bez DPH:	78 000,- Kč
Cena za nové opláštění výtahové šachty bez DPH:	85 000,- Kč
Cena za nová dřevěná madla bez DPH:	15 000,- Kč
Cena za stavební úpravy bez DPH:	18 000,- Kč
<b>Celkem za výtah bez DPH:</b>	<b>661 000,- Kč</b>
Cena za malířské práce dle popisu bez DPH:	44 000,- Kč
<b>Celková cena za modernizaci 1 ks výtahu bez DPH:</b>	<b>705 000,- Kč</b>
DPH 15%	99 150,- Kč
<b>CENA CELKEM ZA MODERNIZACI 1 KS VÝTAHU VČETNĚ DPH :</b>	<b>810 750,- Kč</b>

<b>Celková cena za modernizaci 2 ks výtahů bez DPH:</b>	<b>1 410 000,- Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>211 500,- Kč</b>
<b>CENA CELKEM ZA MODERNIZACI 2 ks VČETNĚ DPH :</b>	<b>1 621 500,- Kč</b>

Změny ve vybavení výtahu si vyžádají zvýšení, popř. snížení ceny.  
Nabídkové ceny jsou platné do 31. 12. 2018.

## Ostatní podmínky

### Nabídka předpokládá, že objednatel zajistí na vlastní náklady související práce:

- poskytnutí uzamykatelné místnosti pro uskladnění nářadí a drobného materiálu potřebného pro montáž
- poskytnutí el. proudu pro ruční el. nářadí
- zajištění SIM karty pro GSM bránu
- provedení revize hlavního přívodu el. Proudu
- zajištění osvětlení nástupišť dle normy 81-20

### Rozsah certifikace:

Naše firma je držitelem certifikátů systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001, environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001.

### Záruční doba:

Délka záruční doby - na výrobní a montážní činnost naší firmy 72 měsíců, na subdodávky dle záruky udané výrobcem.

*Servis výtahů bude zajištěn naší firmou.*

Naše firma zpracuje projektovou dokumentaci, kterou předloží ke schválení autorizované osobě.

Námi nabízený výtah je v souladu s EN 81-20, je možno provést Vámi požadované úpravy, které nebudou v rozporu s uvedenou normou.

Jako subdodávek je použito vybraných tuzemských a evropských výrobců výtahových komponentů.

Po provedení modernizace a předání výtahu bude vystaveno Prohlášení o shodě pro jednotlivé výtahy.

O všech detailech nabídky v rámci platných norem a našich možností jsme připraveni dále jednat.

S pozdravem a v očekávání Vašeho vyjádření k nabídce

Dana Babáková  
obchodní oddělení  
VÝTAHY s.r.o. Velké Meziříčí





## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně  
oddíl C, vložka 5254

Datum vzniku a zápisu:	27. března 1992
Spisová značka:	C 5254 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	VÝTAHY, s.r.o.
Sídlo:	Velké Meziříčí, Vrchovecká 216, PSČ 59429
Identifikační číslo:	463 42 354
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona projektová činnost ve výstavbě zámečnictví, nástrojářství silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení hostinská činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. VIKTOR SOBOTKA, dat. nar. 1. listopadu 1973 Nad Kunšovcem 1306/55, 594 01 Velké Meziříčí Den vzniku funkce: 23. listopadu 2010
jednatel:	LUBOŠ MINAŘÍK, dat. nar. 11. května 1972 Oslavická 1977/35, 594 01 Velké Meziříčí Den vzniku funkce: 14. listopadu 2012
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech věcech.
Společníci:	
Společník:	Ing. VIKTOR SOBOTKA, dat. nar. 1. listopadu 1973 Nad Kunšovcem 1306/55, 594 01 Velké Meziříčí
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 16,67% Druh podílu: základní Kmenový list: kmenový list nebyl vydán
Společník:	JAN PAVELEC, dat. nar. 1. dubna 1975 Příkopy 1217/9, 594 01 Velké Meziříčí
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 16,67% Druh podílu: základní Kmenový list: kmenový list nebyl vydán
Společník:	Bc. TEREZA JIČÍNSKÁ, DiS., dat. nar. 8. března 1988





č.p. 165, 594 01 Vídeň

**Podíl:** Vklad: 100 000,- Kč  
 Splaceno: 100%  
 Obchodní podíl: 16,67%  
 Druh podílu: základní  
 Kmenový list: kmenový list nebyl vydán

**Společník:** OLDŘICH KUŘEC, dat. nar. 3. ledna 1973  
 K Novému světu 2241/38, 594 01 Velké Meziříčí

**Podíl:** Vklad: 100 000,- Kč  
 Splaceno: 100%  
 Obchodní podíl: 16,67%  
 Druh podílu: základní  
 Kmenový list: kmenový list nebyl vydán

**Společník:** LUBOŠ MINAŘÍK, dat. nar. 11. května 1972  
 Oslavická 1977/35, 594 01 Velké Meziříčí

**Podíl:** Vklad: 100 000,- Kč  
 Splaceno: 100%  
 Obchodní podíl: 16,67%  
 Druh podílu: základní  
 Kmenový list: kmenový list nebyl vydán

**Společník:** MARTIN KREJČÍ, dat. nar. 25. června 1979  
 č.p. 136, 594 42 Stránecká Zhoř

**Podíl:** Vklad: 50 000,- Kč  
 Splaceno: 50 000,- Kč  
 Obchodní podíl: 8,335%  
 Druh podílu: základní  
 Kmenový list: kmenový list nebyl vydán

**Společník:** STANISLAV KREJČÍ, dat. nar. 18. května 1971  
 Františky Stránecké 1080/37, 594 01 Velké Meziříčí

**Podíl:** Vklad: 50 000,- Kč  
 Splaceno: 50 000,- Kč  
 Obchodní podíl: 8,335%  
 Druh podílu: základní  
 Kmenový list: kmenový list nebyl vydán

**Základní kapitál:** 600 000,- Kč

**Ostatní skutečnosti:**

Počet členů statutárního orgánu: 2  
 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.




Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem 503/2018, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: PETROVÁ LENKA

Ve Velkém Meziříčí dne 03.01.2018

Podpis









Městský úřad Velké Meziříčí  
odbor obecní živnostenský úřad  
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

Č. j.: ŽIV/499/2018-zezu  
Sp. značka: /267/2018

## Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis obsahuje údaje dle § 60 odst. 5 písm. a) živnostenského zákona

---

Obchodní firma: VÝTAHY, s.r.o.  
Adresa sídla: Vrchovecká 216, 594 01, Velké Meziříčí  
Identifikační číslo osoby: 46342354

### Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě  
Vznik oprávnění: 27.03.1992  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

### Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství  
Vznik oprávnění: 27.03.1992  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

### Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.  
Vznik oprávnění: 13.04.1995  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

### Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihačích zařízení  
Vznik oprávnění: 27.03.1992  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

### Živnostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Obory činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků



Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů  
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí  
Výroba strojů a zařízení  
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství  
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  
Projektování elektrických zařízení  
Testování, měření, analýzy a kontroly  
Překladatelská a tlumočnická činnost  
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Vznik oprávnění: 27.03.1992

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

---

*Živnostenské oprávnění č. 6*

Předmět podnikání: Hostinská činnost

Vznik oprávnění: 23.11.2010

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

---

*Živnostenské oprávnění č. 7*

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování


Vznik oprávnění: 04.04.2012

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

---

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Velké Meziříčí


ve Velkém Meziříčí dne 03.01.2018

  
Zdeňka Peterková  
vedoucí Obecního živnostenského úřadu










# INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE PRAHA

organizace státního odborného dozoru  
inspekční orgán č. 4001

pobočka Brno, Milady Horákové 3, 658 04 Brno,  
tel: 05/45 21 43 34 fax: 05/45 21 03 83

Čj. 391/09 03/00/15 09/2



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE  
D'ORGANISMES DE CONTRÔLE



## OPRÁVNĚNÍ

ev. č.: 0874/9/00/ZZ-V,M,G,O,R,Z-I,II,III,V

vydané ve smyslu § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a § 3 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb. na základě verifikace odborné způsobilosti dne 15. února 2000

k - výrobě, montážím, generálním opravám, rekonstrukcím, opravám, revizím a revizním zkouškám zdvihacích zařízení dodavatelským způsobem

v rozsahu - zdvihadla a pojízdná zdvihadla  
- jeřáby  
- pohyblivé pracovní plošiny  
- výtahy, které jsou trvalou součástí staveb

pro

subjekt: **VÝTAHY s. r. o.**

adresa: Vrchovecká 216, Velké Meziříčí

PSČ: 594 29


IČO: 46342354

odpovědný zástupce: Ing. Karel Sobotka

rodné číslo: 420314/453

Podmínky platnosti jsou uvedeny v zápisech ITI Praha čj. 729/9/95/15.9 ze dne 25. dubna 1995, čj. 3969/09.03/98/15.09/1 ze dne 23. října 1998 a čj. 391/09.03/00/15.09/1 ze dne 15. února 2000, které jsou nedílnou součástí tohoto oprávnění.

V Brně dne 22. února 2000



Ing. František FÍREŠ  
vedoucí inspektor  
ITI Praha, pobočka Brno

Toto oprávnění ruší oprávnění ev. č. 0810/9/98/ZZ-V,M,G,O,R,Z-V vydané ITI Praha v Brně dne 2. listopadu 1998



Finanční úřad ve Velkém Meziříčí  
Hornoměstská 864/39  
594 01 VELKÉ MEZIRÍČÍ  
Čj.: 24610/07/353900/3571  
Vyřizuje: Rašovská Eva  
Telefon: 566 501 305                      linka: 305  
Fax: 566 501 398                              č. dveří: 322

Ve Velkém Meziříčí  
dne 30.03.2007

Daňový subjekt:

VÝTAHY, s.r.o.  
Vrchovecká 216  
594 29 VELKÉ MEZIRÍČÍ

### O S V Ě D Ě N Í o registraci

Podle § 33 odst. 12 a 13 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní"), jste u shora uvedeného správce daně zaregistrován s účinností od 22.03.1993 a je vám přiděleno toto daňové identifikační číslo:

DIČ: CZ46342354

Současně se ukončuje platnost Osvědčení o registraci  
čj. 58424/06/353900/4523 ze dne 12.12.2006.

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 111 bodu 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů jste  
**plátcem daně z přidané hodnoty**  
s účinností od 01.01.1993

Daňové identifikační číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace se správcem daně a v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní zákon (§ 33 odst. 12 zákona o správě daní). Při všech platbách, poukazovaných správci daně, použijte jako variabilní symbol kmenovou část DIČ (tj. číslo za kódem CZ).

Veškeré změny údajů, týkající se Vaší registrace, jste povinen oznámit shora uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (§ 33 odst. 7 zákona o správě daní).

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení, písemně nebo ústně do protokolu u shora uvedeného správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 48 zákona o správě daní).



Anna Pešková  
vedoucí oddělení  
registračního a evidence daní

